



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

CONTRATO: MC/DOP/03RP/2025/LPN-003
CONTRATISTA: PROYECTOS Y MATERIAL ARQUITECH, S.A. DE C.V.
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE AMADO NERVO, UBICACIÓN ENTRE AVENIDA AMADO NERVO Y CALLE XOLOTH, COLONIA EL PARAISO.

EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA DOCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 12.57 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 230, 231 Y 232 DE SU REGLAMENTO, SE CONSTITUYEN EL M. EN ING. FELIPE DE JESÚS JIMÉNEZ RAMÍREZ, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR NÚMERO [REDACTED] ING. MICHEL GARCÍA ESPINOZA, SUBDIRECTOR DE RESIDENCIA Y CONSTRUCCIÓN, ENCARGADO DE LA RECEPCIÓN DE LA MISMA, QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR NÚMERO [REDACTED] MTRO. MIGUEL ÁNGEL CUATE RUIZ, ENCARGADO DEL DESPACHO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR NÚMERO [REDACTED] INTERVINIENDO ESTE ÚLTIMO EN EL PRESENTE ACTO EN ATENCIÓN A LA INVITACIÓN FORMULADA MEDIANTE OFICIO NUMERO DOP/1309/2025. LO ANTERIOR CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA **CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE AMADO NERVO, UBICACIÓN ENTRE AVENIDA AMADO NERVO Y CALLE XOLOTH, COLONIA EL PARAISO**, MISMA QUE FUE ADJUDICADA BAJO EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO MC/DOP/03RP/2025/LPN-003, A FAVOR DE LA EMPRESA **PROYECTOS Y MATERIAL ARQUITECH, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL CIUDADANO BENITO HERNÁNDEZ MORI AN. FN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR NÚMERO [REDACTED] Y COMPARECE A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LO REQUERIDO MEDIANTE OFICIO NÚMERO DOP/1310/2025, DE FECHA VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO; OBRA QUE FUE AUTORIZADA DURANTE EL DESAHOGO DEL PUNTO TRES DE LA SEXTA SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO, CON CARÁCTER DE EXTRAORDINARIA, DE FECHA ONCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.

ASÍ MISMO, EN REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD BENEFICIADA CON LA OBRA PÚBLICA DE REFERENCIA, COMPARECEN LOS MIEMBROS DEL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA (COCICOVI), A SABER: C. ERNESTO CORTÉS AYALA, EN SU CARÁCTER DE CONTRALOR SOCIAL "A"; C. JORGINA CORTÉS AYALA, EN SU CARÁCTER DE CONTRALOR SOCIAL "B"; Y C. LOURDES PAREDES DÍAZ, EN SU CARÁCTER DE CONTRALOR SOCIAL "C"; QUIENES INTERVIENEN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 113 A, 113 B, 113 C, 113 D FRACCIÓN VII Y 113 G DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; 12.57 Y 12.58 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO; ASÍ COMO 230, 231 Y 232 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL PROPIO CÓDIGO ADMINISTRATIVO.

POR LO ANTERIOR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO SIGUIENTE:

I. LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE LEVANTE:

POR CUANTO HACE A LA FECHA Y HORA HAN QUEDADO ESTABLECIDAS AL PROEMIO DE LA PRESENTE ACTA, Y SE ENCUENTRAN CONSTITUIDAS "LAS PARTES" QUE INTERVIENEN EN EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DE OBRA PÚBLICA, CONSTITUYÉNDOSE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.

II. NOMBRE Y FIRMA DEL RESIDENTE Y DEL SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD Y DEL SUPERINTENDENTE POR PARTE DEL CONTRATISTA:

RESIDENTE DE OBRA	ARQ. MARCO ANTONIO MOYA GONZÁLEZ
SUPERVISOR DE OBRA (EN SU CASO)	N/A
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN "EL CONTRATISTA"	ARQ. BENITO HERNÁNDEZ MORLAN

III. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE POR MEDIOS MECÁNICOS, CARGA POR MEDIOS MECÁNICOS Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATOS TOPOGRÁFICOS PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL, LLENADO Y COLOCACIÓN DE COSTAL DE RAFIA (50 KG) CON TEPETATE, PARA CONTENCIÓN DE TALUDES EN EXCAVACIONES (ZANJAS), OBRA DE DESVIÓ EN EL TREN DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES DEL CÁRCAMO DE BOMBEO DE CANAL A RED DE DRENAJE (CAJA COLECTORA), EXCAVACIÓN PARA DESAZOLVE EN CANAL DE AGUAS RESIDUALES, CON EXTRACCIÓN DE





ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

CONTRATO: MC/DOP/03RP/2025/LPN-003
CONTRATISTA: PROYECTOS Y MATERIAL ARQUITECH, S.A. DE C.V.
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE AMADO NERVO, UBICACIÓN ENTRE AVENIDA AMADO NERVO Y CALLE XOLOTH, COLONIA EL PARAISO.

[Handwritten signature]

LODO, BOMBEO DE ACHIQUE, CON MOTOBOMBA DE 76 MM DE DIÁMETRO, CARGA POR MEDIOS MECÁNICOS Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESAZOLVE, CONSTRUCCIÓN DE CAPA ESTABILIZADORA EN CANAL DE AGUAS RESIDUALES, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (BALASTRE DE 2" A 6"), REUBICACIÓN DE POSTE DE MADERA (TELÉFONO) DE ACUERDO A PROYECTO, REUBICACIÓN Y REPOSICIÓN DE POSTE DE CONCRETO (CFE) DE ACUERDO A PROYECTO, CORTE Y/O EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS PARA DAR NIVEL DE SUB RASANTE, CARGA POR MEDIOS MECÁNICOS Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, AFINE Y COMPACTACIÓN DE LA SUB RASANTE POR MEDIOS MECÁNICOS, CONSTRUCCIÓN DE SUB-BASE HIDRÁULICA DE GRAVA CONTROLADA (GRAVA 3/4" 70% -TETEPATE 30%), DE 20 CM DE ESPESOR TERMINADA, CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE GRAVA CONTROLADA (GRAVA 3/4" 70%-ARENA 30%), RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA, APLICADA CON PETROLIZADORA A RAZÓN DE 1.50 L/M2., RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA APLICADA CON PETROLIZADORA A RAZÓN DE 0.70 L/M2., CARPETA DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO, SELLO DE CEMENTO GRIS SOBRE ASFALTO, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO MR-35 DE 15 CM DE ESPESOR, EN RAMPAS VEHICULARES Y DE EMPATE CON CALLE EXISTENTE, CORTE DE TERRENO A MÁQUINA PARA BANQUETAS Y GUARNICIONES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEPETATE PARA DESPLANTE DE BANQUETAS Y/O ANDADORES, GUARNICIÓN DE 0.15 X 0.20 X 0.50 M DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR, CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 150 KG/CM2, MURO DE PIEDRA BRAZA, DE 30 CMS DE CORONA Y 80 CMS DE BASE, ALTURA VARIABLE, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIONES, ALQUINAL HULE CLORADO VÍA COLOR SEÑALAMIENTO DE TRÁNSITO COLOR AMARILLO, PINTURA TRÁFICO PARA BALIZAMIENTO COLOR AMARILLO NO. 68-53 COMEX O COLOR BLANCO 68-51 COMEX VÍA COLOR SEÑALAMIENTO DE TRÁNSITO, CON MICRO ESFERA REFLEJANTE, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA MARIMBAS, TOPES Y FLECHAS, PARA TRÁFICO AMARILLO NO. 68-53 Y/O BLANCA NO. 68-51, VÍA COLOR SEÑALAMIENTO DE TRÁNSITO, CONSTRUCCIÓN DE MARCO METÁLICO PARA RESTRICCIÓN DE VEHÍCULOS PESADOS, CONSTRUCCIÓN DE SUB-BASE DE TEZONTLE EN GREÑA (4" A FINOS), CONSTRUCCIÓN DE TOPE ASFALTICO COMPACTO DE 0.12 M AL CENTRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA CHECK DE PVC ANTIRRETORNO PARA DRENAJE DE 10" DE DIÁMETRO.

[Handwritten signature]

IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS;

MONTO CONTRATADO CON IVA	MONTO EJERCIDO DE CONTRATO CON IVA	IMPORTE POR CANCELAR NO EJERCIDO DEL CONTRATO CON IVA	IMPORTE AMORTIZADO DEL MONTO EJERCIDO DEL CONTRATO
\$ 5,999,114.43	\$ 5,999,114.43	\$ 0.00	\$ 1,799,734.33

MONTO DE CONVENIO EJERCIDO CON IVA
 \$ 0.00

V. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS;

PLAZO DE EJECUCIÓN CONFORME A CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONFORME A CONTRATO	PERIODO REAL DE EJECUCIÓN	PERIODO REAL DE EJECUCIÓN DE CONVENIO
120 (CIENTO VEINTE) DÍAS CALENDARIO	15 DE MAYO DE 2025 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025	17 DE JUNIO DE 2025 AL 14 DE OCTUBRE DE 2025	N/A

[Handwritten signature]

VI. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS A LA FECHA, ASÍ COMO LOS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN;





ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

CONTRATO: MC/DOP/03RP/2025/LPN-003
CONTRATISTA: PROYECTOS Y MATERIAL ARQUITECH, S.A. DE C.V.
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE AMADO NERVO, UBICACIÓN ENTRE AVENIDA AMADO NERVO Y CALLE XOLOTH, COLONIA EL PARAISO.

ESTIMACIONES PAGADAS O POR PAGAR:

ESTIMACIÓN NÚMERO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTOS		TOTAL DE DEDUCCIONES	PAGADO NETO	ADEUDO NETO
	DE:	A:	SIN I.V.A.	CON I.V.A.			
01 (UNO)	17/06/2025	20/08/2025	\$ 2,430,675.02	\$ 2,819,583.02	\$ 845,874.91	\$ 1,973,708.11	\$ 0.00
02 (DOS)	21/08/2025	22/09/2025	\$ 1,666,192.07	\$ 1,932,782.80	\$ 579,834.84	\$ 1,352,947.96	\$ 0.00
03 (TRES) FINIQUITO	23/09/2025	14/10/2025	\$ 1,074,783.28	\$ 1,246,748.61	\$ 374,024.58	\$ 0.00	\$ 872,724.03
		TOTAL	\$ 5,171,650.37	\$ 5,999,114.43	\$ 1,799,734.33	\$ 3,326,656.07	\$ 872,724.03

VII. DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, Y

ENTREGA DE:		OBSERVACIÓN
PLANOS ACTUALIZADOS DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL	SI	
MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	NO	
CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y DE SERVICIO DE LOS BIENES INSTALADOS	NO	

VIII. CONSTANCIA DE QUE EL CONTRATISTA ENTREGÓ A LA RESIDENCIA LOS DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

BAJO QUE DOCUMENTAL LA RESIDENCIA Y/O SUPERVISIÓN HACEN CONSTAR LA ENTREGA DE DOCUMENTOS: SE ENTREGA ESTIMACIÓN FINIQUITO.

POR OTRA PARTE, LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS A TRAVÉS DE LA RESIDENCIA HACEN CONSTAR LA SIGUIENTE:

- a) **FUENTE DEL RECURSO:** RECURSOS PROPIOS (RP).
- b) **GARANTÍAS:**

ANTICIPO:

FIANZA NÚMERO: **3908-06635-0**
 AFIANZADORA: **ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.**
 MONTO: **\$ 1,799,734.33**
 VIGENCIA: **DURANTE TODO EL PROCESO DE LA OBRA.**
 BENEFICIARIO: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO.**

CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:

FIANZA NÚMERO: **3908-06636-9**
 AFIANZADORA: **ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.**
 MONTO: **\$ 599,911.44**
 VIGENCIA: **DURANTE TODO EL PROCESO DE LA OBRA.**
 BENEFICIARIO: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO.**





ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

CONTRATO: MC/DOP/03RP/2025/LPN-003
CONTRATISTA: PROYECTOS Y MATERIAL ARQUITECH, S.A. DE C.V.
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE AMADO NERVO, UBICACIÓN ENTRE AVENIDA AMADO NERVO Y CALLE XOLOTH, COLONIA EL PARAISO.

DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS:

FIANZA NÚMERO: 3908-06790-6

AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

MONTO: \$ 599,911.44

VIGENCIA: **DOCE MESES A PARTIR DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA MISMA QUE DEBERA ESTAR VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE.**

BENEFICIARIO: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO.**

DE IGUAL FORMA, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CONTRATISTA QUE NO OBSTANTE LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, DE MANERA FORMAL QUE EN ESTE ACTO SE LLEVA A CABO, QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HAYA INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO NÚMERO **MC/DOP/03RP/2025/LPN-003**, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 12.58 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO; 231, 234 Y DEMÁS DISPOSICIONES NORMATIVAS APLICABLES DE SU REGLAMENTO. ASIMISMO, SE DEJA CONSTANCIA PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES QUE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA FUNGEN EN ESTA DILIGENCIA DE ENTREGA DE OBRA PÚBLICA COMO TESTIGOS, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS NUMERALES 113 D FRACCION VII Y 113 G DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO.

NO EXISTIENDO OBSERVACIONES NI MANIFESTACIONES ADICIONALES RESPECTO DE LA PRESENTE ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS CONCERNIENTES A LA OBRA PÚBLICA DE REFERENCIA, SE DA POR CONCLUIDA SIENDO **LAS 11 HORAS, CON 30 MINUTOS** DE LA MISMA FECHA Y LUGAR DE SU INICIO, FIRMANDO PARA CONSTANCIA AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, PREVIA LECTURA Y RATIFICACIÓN DE SU CONTENIDO PARA LOS EFECTOS LEGALES Y/O ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES.

**POR EL AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO,
SU UNIDAD EJECUTORA:**

M. EN ING. FELIPE DE JESÚS JIMÉNEZ RAMÍREZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. MICHEL GARCÍA ESPINOZA
SUBDIRECTOR DE RESIDENCIA Y
CONSTRUCCIÓN

POR "EL CONTRATISTA"

PROYECTOS Y MATERIAL ARQUITECH, S.A DE C.V.

C. BENITO HERNÁNDEZ MORLAN
APODERADO LEGAL

C. BENITO HERNÁNDEZ MORLAN
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN






ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

CONTRATO: MC/DOP/03RP/2025/LPN-003
CONTRATISTA: PROYECTOS Y MATERIAL ARQUITECT, S.A. DE C.V.
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE AMADO NERVO, UBICACIÓN ENTRE AVENIDA AMADO NERVO Y CALLE XOLOTH, COLONIA EL PARAISO.

POR "EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL"
DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN, MÉXICO"

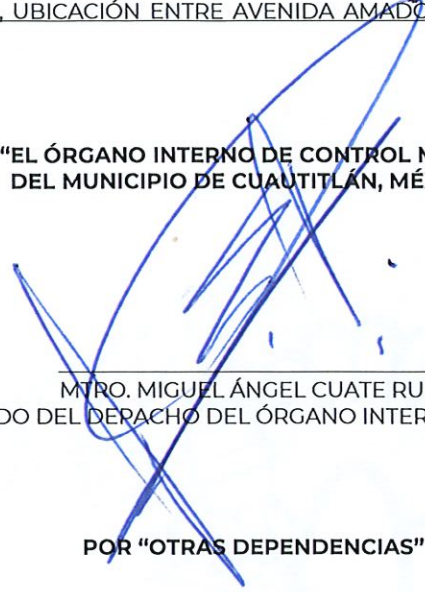

MTRO. MIGUEL ÁNGEL CUATE RUIZ
ENCARGADO DEL DEPACHO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

POR "OTRAS DEPENDENCIAS"

No ASISTIÓ, SE INVITO MEDIANTE
OFICIO No. DOP/1298/2025,
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO E
INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO.

POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA (COCICOVI):



C. ERNESTO CORTÉS AYALA
CONTRALOR SOCIAL "A"



C. JÓRGINA CORTÉS DÍAZ
CONTRALOR SOCIAL "B"



C. LOURDES PAREDES DÍAZ
CONTRALOR SOCIAL "C"

